ID		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**rekonstrukce silnice III/2923 Chuchelna**	**24 dny**	**14.11. 16**	**15.12. 16**
2		**komunikace**	**24 dny**	**14.11. 16**	**15.12. 16**
3		KSC	5 dny	15.11. 16	21.11. 16
4		recyklace za studena	2 dny	21.11. 16	22.11. 16
5		asfalty	6 dny	23.11. 16	30.11. 16
6		obruby	6 dny	14.11. 16	21.11. 16
7		dokončovací práce	11 dny	01.12. 16	15.12. 16
8		**most SO201**	**23 dny**	**15.11. 16**	**15.12. 16**
9		římsy	3 dny	15.11. 16	17.11. 16
10		dokončovací práce	20 dny	18.11. 16	15.12. 16
11		**most SO202**	**19 dny**	**21.11. 16**	**15.12. 16**
12		římsy	3 dny	21.11. 16	23.11. 16
13		dokončovací práce	16 dny	24.11. 16	15.12. 16

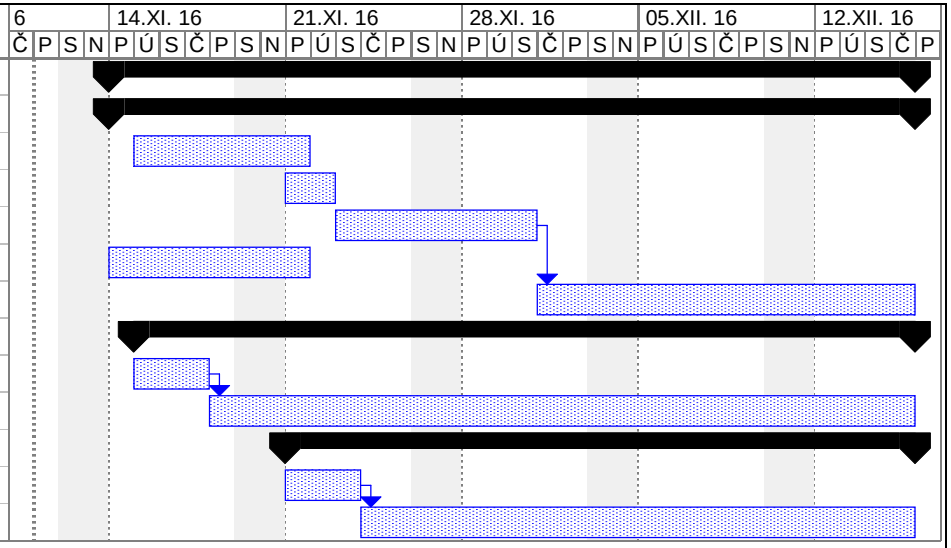

Projekt: hmg 11112016
Datum: 11.11. 16

Úkol		Milník		Vnější úkoly	
Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	
